



Progresso de Projetos - TC

Transparência e Comunicação

Area

Todos

Nome do Projeto

Todos

Custos

Todos

Progresso

Nome do Projeto	Início	Término	Total Tarefas	Completas
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	03/08/2018	30/08/2022		
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	15/06/2020	12/08/2022	1.461	1.060
Total			2.463	2.036


Progresso Físico

% Previsto	% Realizado
100,00%	99,48%
97,25%	94,00%

Progresso Financeiro (MBRL)

Nome do Projeto	Orçamento	Gasto
Unidade de Triagem de materiais rec...	30.000.000	25.744.892
Escola de Trabalho e Produção do P...	25.000.000	21.916.911
Total	55.000.000	47.661.803

Cronograma | Linha do Tempo

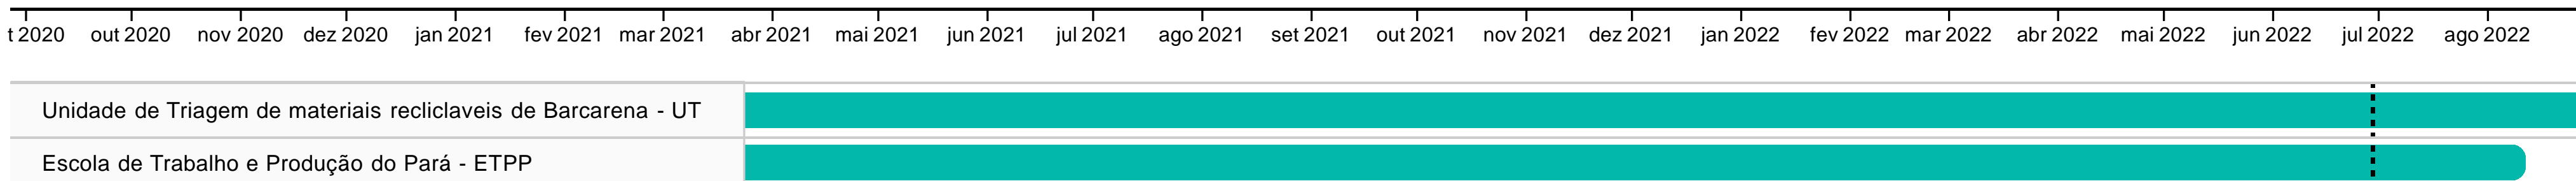

Proximos Marco | Tarefas

Nome do Projeto	Marco do Projeto	Término	Status	KPI
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Engenharia	06/04/21	Concluído	✓
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Suprimentos	14/09/21	Concluído	✓
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Construção	30/06/22	Em andamento	!
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Gerenciamento	30/06/22	Em andamento	!
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Conclusão do Projeto	15/08/22	Futuro	○
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Engenharia	08/12/21	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Suprimentos	20/06/22	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Construção	03/08/22	Em andamento	!
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Gerenciamento	30/08/22	Em andamento	!
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Conclusão do Projeto	30/08/22	Futuro	○

Previsto vs Realizado

